



MELDING OM GRAVING

ARBEIDENE GJELDER		
Tiltak:	Gnr.:	Bnr.:
_____	_____	_____
Tiltakshaver og fakturamottaker:	Postadresse:	Telefon:
_____	_____	_____
Ansvarlig utførende:	Adresse:	Telefon:
_____	_____	_____
Er anlegget søknadspliktig etter plan- og bygningsloven	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
Er det innhentet godkjenning fra byggemyndighetene	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
Berører arbeidene Kommunal veg og/eller eiendom	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
Berører arbeidene vernede områder	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
Berører arbeidene Fylkesveg/Statens Vegvesen	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
Er det utarbeidet varslingsplan for arbeidene	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
Berører arbeidene Kattneset / Holmen		Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
Foreligger det skriftlig tillatelse fra grunneier		Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>

MELDINGEN ER FOREVIST TIL

ØKSNES KOMMUNE, DRIFSAVD. Rør/ledninger i graveområdet, påvises Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Kart følger vedlagt: Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Dato _____ Underskrift _____	ØKSNES KOMMUNE, KART OG OPPMÅLING Grensemerker/polygonpunkt Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Kart følger vedlagt: Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Dato _____ Underskrift _____
TILBAKEMELDING Vesterålskraft Mottatt <input type="checkbox"/> Sortland Elektro (Kabel-TV) Mottatt <input type="checkbox"/> Geomatikk (Telenor) MÅ INNHENTES SÆRSKILT på tlf. 09146 www.gravemelding.no - gravemelding.trondheim@geomatikk.no	<input type="checkbox"/> PRIVATE VANNVERK/AVLØP <input type="checkbox"/> VESTERÅLEN OLJE AS / MINOL Rør/ledninger i graveområdet, påvises Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Kart følger vedlagt: Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Dato _____ Underskrift _____

Det gjøres oppmerksom på at en godkjent gravemelding kun er en påvisning av kommunalt ledningsnett, og ikke en gravetillatelse ovenfor privat/offentlig grunneier. Vær oppmerksom på at påvisning av kommunale ledninger ikke er nøyaktig, avvik kan forekomme. Det må utvises stor varsomhet ved graving nær påviste kabler eller rør for å unngå skade.

Godkjent gravemelding gjelder ikke som grunnrettighet for graving ut over offentlige veier, ledningstraseer eller meldepliktige tiltak etter Plan- og bygningsloven.

For tomteuttak, eller vann/avløp i forbindelse med tomteuttak, gjelder gravetillatelsen ikke før byggetillatelse er gitt og ved nye tilkoblinger for vann/avløp, skal kvittering for betalt tilkoplingsavgift forevises før det gis gravetillatelse.

Ved arbeid på offentlig veg gjelder bestemmelsene i Veglovens §§ 32 og 57, samt forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg.

Skader som ansvarlig utførende har påført veg, kummer, ledninger, rør eller andre innretninger som følge av gjennomføring av tiltak, er denne ansvarlig for. Dette kan derfor uten nærmere varsel utbedres av Øksnes kommune for undertegnede regning i en tidsperiode på 3 år etter utførte tiltak.

Ved feil i områdeavgrensning, eller motstrid mellom kart og tilbakemelding, så skal mottaker ta kontakt med Øksnes kommune for retting. Melding om eventuell skade(r) på kabler eller rør skal skje til nett- eller rør eier så snart som mulig. Dersom kunden mener at skaden skyldes feil ved kart, skal skaden meldes Øksnes kommune umiddelbart.

Oversikt over private ledninger, stikkledninger og lignende omfattes ikke av gravetillatelsen og må anvises av eier.

Undertegnede har lest, forstått og forplikter seg til å utføre arbeidene i henhold til de normer, krav og planer som forelå ved denne søknaden, og i samsvar med de merknader som fremkommer på denne. Anvisninger som blir gitt av involverte etater vil bli fulgt. PLANER FOR ARBEIDET VIL IKKE BLI FRAVEKET UTEN SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA ØKSNES KOMMUNE, TEKNISK ENHET.	
_____	_____
Sted og dato	Underskrift

Merknader

.....

.....

.....

Gravetillatelse er gitt, og er gyldig i 1 måneder fra underskriftsdato.	
_____	_____
Sted og dato	Underskrift

GRAVEMELDING, DEL 2

Reglement for graving på/i kommunale eiendommer og vegger

Øksnes kommune registrerer ulik praksis hos de enkelte entreprenører angående tilkopling til kommunalt VA-nett. For å få en uniform gjennomføring av tilkoplinger er det innført VA-norm for Øksnes kommune, denne er basert på VA/Miljø-blader, NS, tekniske- og administrative bestemmelser på kommunalt VA-nett.

Øksnes kommune er veg holder og myndighet for offentlig kommunale eiendommer, veg- og parkarealer i Øksnes kommune. Graving i offentlig veg kan bidra til forringelse og det er derfor satt krav til utførelsen. Iht. § 57 i Vegloven kan ingen utføre graving i offentlig veg uten tillatelse fra vegmyndigheten. Skjema for søknad om graving/gravemelding finnes på kommunens nettside. Graving i offentlig veg kan bare utføres av firma som er forhåndsgodkjent av veg holder iht. Vegloven.

Tilkopling til kommunale ledninger skal i utgangspunktet utføres av Øksnes kommunes eget personell, men kan etter nærmere avtale utføres direkte av entreprenør. Dersom tilkopling utføres av godkjent entreprenør, skal tilkopling besiktiges av kommunalt personell før på graving kan utføres.

Tilkopling skal varsles minimum 14 dager før utførelse, grunnet leveringstid på materiell og personell resurser.

Dersom overnevnte ikke overholdes, vil Øksnes kommune pålegge utførende at tilkoblingspunkt graves opp for besiktigelse, kostnader for dette må dekkes av utførende entreprenør. Dersom ikke pålegg etterfølges vil Øksnes kommune selv foreta oppgraving, kostnader med oppgraving og evt. nødvendig utbedring vil da bli fakturert ansvarlig utførende entreprenør.

Ansvarlig utførende entreprenør (heretter kalt **Entreprenøren**) skal som oppstarts krav dokumentere relevant erfaring fra de siste 3 år og inneha sentral godkjenning gitt for følgende fagområde(r):

c.2 Grunnarbeid og landskapsutforming, tiltaksklasse 2, herunder:


- utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for vegger med forutsatt ÅDT høyst 5000, planeringsarbeider, utførelse av forstøtningskonstruksjoner og skråningsbeskyttelse tilsvarende «vanskelige forhold» i følge Statens vegvesens håndbok N200.

c.3 Grunnarbeid og landskapsutforming, tiltaksklasse 3, herunder:

- grunn- og terrengarbeider som omfatter planeringsarbeider, utførelse av forstøtninger og skråningsbeskyttelse tilsvarende «ekstreme forhold» i følge Statens vegvesens håndbok N200, skråninger mot vann eller utførelse av erosjonsbeskyttelse.
- utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for vegger med stor belastning over 5000 ÅDT. Ved tvil om stor belastning eller ÅDT, avgjør kommunen basert på kompleksitet, erfaring og referanser.

Vilkår:

1. Entreprenøren må bringe offentlig eiendom, herunder veg med tilhørende anlegg, tilbake i opprinnelig stand.
2. Lagring av masser i offentlig vegareal er ikke tillatt. Bruk av maskin med stålbelter er ikke tillatt på offentlig asfaltert veg.
3. Trase skal i prinsippet gås opp i forkant av gravearbeidet, ved befaring der tiltakshaver, utførende og oppsyn er til stede. Øksnes kommune sine anvisninger skal følges, både med hensyn til grøftens plassering i gateprofilen og utførelse for øvrig.
4. Ved graving i eller kryssing av offentlig veg skal det utføres utkiling og masseutskifting i rørets lengderetning, dette gjelder overgang mellom gammel og ny fylling. Bredden på utkilingen er 5 x dybden på grøften, hver vei.
5. Lednings-/kabelgrøften skal utføres iht. VA/Miljø-blad nr. 5 og 6. Grøften skal gjenfylles omhyggelig slik at setninger forhindres, det vil si lagvis gjenfylling der hvert 30 centimeters lag komprimeres. Overdekning i vegfortau skal være min. 60 cm. Overdekning i vegggrøft skal være min. 80 cm.
6. Ledningsgrøfter for vann- og avløpsrør skal ligge frostfritt, vis dette ikke er mulig. Så skal det gjøres tiltak i form av isolering eller varmekabler for å sikre at rørene ikke fryser.
7. Ved graving som medfører endring av overdekningen på vann- og avløpsrør er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra Øksnes kommune. Dette er for å sikre at vann- og avløpsrør ikke skal fryse.
8. Langsgående graving i skulder og skråning er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra Øksnes kommune.
9. Kabel som skal krysse offentlig gate/veg eller føres gjennom vegkryss, skal legges i trekke rør uten kostnader for veg holder.
10. Der grøften krysser offentlig asfaltert veg, skal de øverste 5 cm midlertidig lappes med kaldasfalt. Utføres umiddelbart og holdes ved like fram til asfaltering.
11. Entreprenøren plikter å holde gravestedet i forsvarlig stand helt til endelig asfaltering blir gjennomført. Herunder etterfylling og renhold.
12. Endelig asfaltering blir gjennomført av Øksnes kommune for Entreprenørens kostnad. Gravemeldingen er en bestilling av dette arbeidet.
13. Ved klargjøring blir asfalten saget i en bredde på minimum 150 cm fra overgang mellom gammel og ny fylling, dette for å oppnå tilstrekkelig komprimering og kvalitet. Sagebredden vil variere med ev. skader, manglende renhold og lignende, men vil i grove trekk kunne avtales iht. pkt. 3.
14. Etter langsgående graving i fortau skal endelig asfaltering utføres heldekkende i gravestrekningens fulle lengde og brede.
15. Kostnadene for utbedring av skader som følge av setninger e.l. vil bli belastet Entreprenøren inntil 36 måneder etter gravingen, regnet fra sluttdato i påtegnet gravesøknad.
16. Arbeidsvarsling skal utføres av Entreprenøren i henhold til Statens vegvesens håndbok N301. Plan for arbeidsvarsling skal vedlegges søknad om graving i kommunal veg.
17. Avvik fra dette reglement, gjeldende forskrifter eller gitte pålegg behandles iht. gjeldende lovverk. bl.a. kan Øksnes kommune trekke tilbake tillatelsen til å grave i offentlig kommunalt eiendommer og vegareal i jf. § 57 i Vegloven.

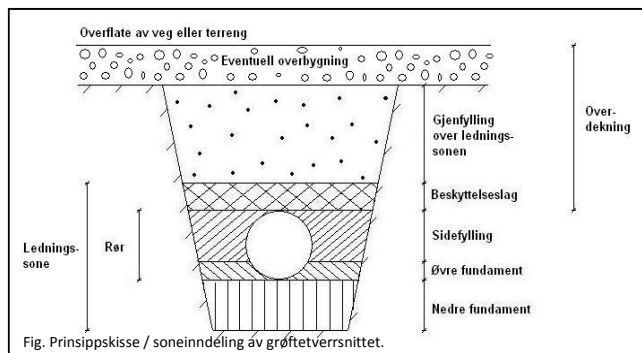

	Prosedyre for entreprenører og andre ved arbeid nær spenningsførende anlegg tilhørende Vesterålskraft Nett		Dok.id.: 2.1.1.23 Versjon: 1.00 Dato: 14.05.2018
	Prosedyre	Utarbeidet av: Bård Angeltveit	Godkjent av: Ola Pedersen

Formål

Prosedyren beskriver prosess, rettigheter og plikter ved arbeid på / ved høyspent og lavspent anlegg hos Vesterålskraft Nett.

Omfang

Prosedyren omfatter **internt personell hos Vesterålskraft Nett**, som behandler/besvarer denne typen henvendelser, og **eksterne entreprenører og andre** som utfører arbeid i forsyningsområdet til Vesterålskraft Nett AS (Sortland, Øksnes, Bø og Kvæfjord kommune). Prosedyren er underordnet de til enhver tid gjeldende forskrifter og regelverk.

Ansvar

ANSVARLIG - FOR UTFØRELSE AV ARBEIDET - FORPLIKTER SEG TIL Å OVERHOLDE PROSEDYRENS BESTEMMELSER.

Aktivitet/beskrivelse

Ved arbeid nær spenningsførende deler skal:

- Nær ved-avtale signeres av utførende entreprenør.
- Vesterålskraft Nett kontaktes ved arbeidsdagens start og ved arbeidsdagens slutt, med mindre annet er avtalt i Nær ved-avtale.

Kabelanlegg

- Graving, boring, nedsetting av stolper og lignende må ikke startes før gravemeldingstjenesten ved Vesterålskraft Nett er kontaktet og evt. kabeltraseer er påvist i området. Kabelens dybde og kart kan normalt ikke oppgis.
- Kabelpåvisning er gratis for utbygger i normal arbeidstid, og utføres primært på mandag og torsdag.
- Uforsvarlig behandling av strømkabler kan medføre livsfare. Ved avdekning, kryssing, flytting, samt oppheng/sikring av høyspentkabler skal Vesterålskraft Nett kontaktes for å foreta en risikovurdering og eventuelt beslutte om kabelen kan frakobles.
- Etter avdekning og evt. flytting, skal kabelen overdekkes uten unødig opphold. Arbeidsstedet skal ikke forlates før avdekte kabler er tilfredsstillende beskyttet.
- Dersom kabelunderlaget fjernes, skal det etableres forsvarlig understøttelse/oppheng iht. gjeldende regelverk – kontakt Vesterålskraft Nett.
- Igjenfylling etter graving hvor kabler er avdekt, skal følge gjeldende regelverk – kontakt Vesterålskraft Nett.
- Dersom påvisning eller kart ikke stemmer, må Vesterålskraft Nett kontaktes før grøften fylles igjen.
- Gravemelding skal foreligge hos utfører og skal fremvises på forespørsel fra Vesterålskraft Nett.

Høyspenningsluftlinjer

Ved arbeid, graving, sprenging, kranarbeid og lignende nærmere enn 30 meter fra høyspennings luftlinjer, skal Vesterålskraft Nett kontaktes på forhånd for å anviser nødvendige sikringstiltak.

Skadevolders erstatningsplikt

Dersom anleggsarbeidet forårsaker skade på 3. parts eiendom, Vesterålskraft Nett sine anlegg eller avbrudd i strømforsyningen, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader.

Kontaktinformasjon	Telefon	Åpningstid
Vesterålskraft Nett – Gravemelding og påvisning, Nær ved-avtale	76 11 25 01	07.30 – 15.00
Vesterålskraft Nett - Vaktberedskap	76 11 25 10	00.00 – 24.00

Kryssreferanser

[2.1.1.24](#) Nær ved-avtale

Eksterne referanser
